



PROPOSITION TECHNIQUE & FINANCIÈRE

ERP DE GESTION INTÉGRÉ

Une plateforme unique pour piloter les projets, les ventes,
les opérations et la rentabilité de toutes les activités
d'OLIVE DANAROY.

PRÉPARÉ POUR

OLIVE DANAROY SARLU

16 juillet 2026 • Abidjan, Côte d'Ivoire

DOCUMENT DE TRAVAIL — VALIDITÉ 30 JOURS

Synthèse de l'offre

Un ERP modulaire, déployé par étapes, avec un pilotage financier consolidé.

01

Objectif prioritaire

Remplacer les fichiers dispersés et les suivis manuels par une base de données commune, des circuits de validation et des tableaux de bord fiables pour chaque activité.

36,85 M FCFA

BUDGET FORFAITAIRE INDICATIF • HT

Hors hébergement, support récurrent et services tiers.

24 semaines

cadrage jusqu'à la mise en production

50 utilisateurs

hypothèse de dimensionnement initial

5 sites

siège et implantations opérationnelles


4 semaines

d'accompagnement renforcé après lancement

RECOMMANDATION Lancer d'abord le socle commun et le BTP, puis activer les modules restaurant, salles et lavage auto sur la même plateforme.

Toutes les activités réunies dans un seul système

Le socle commun évite les doubles saisies tout en conservant les processus propres à chaque métier.

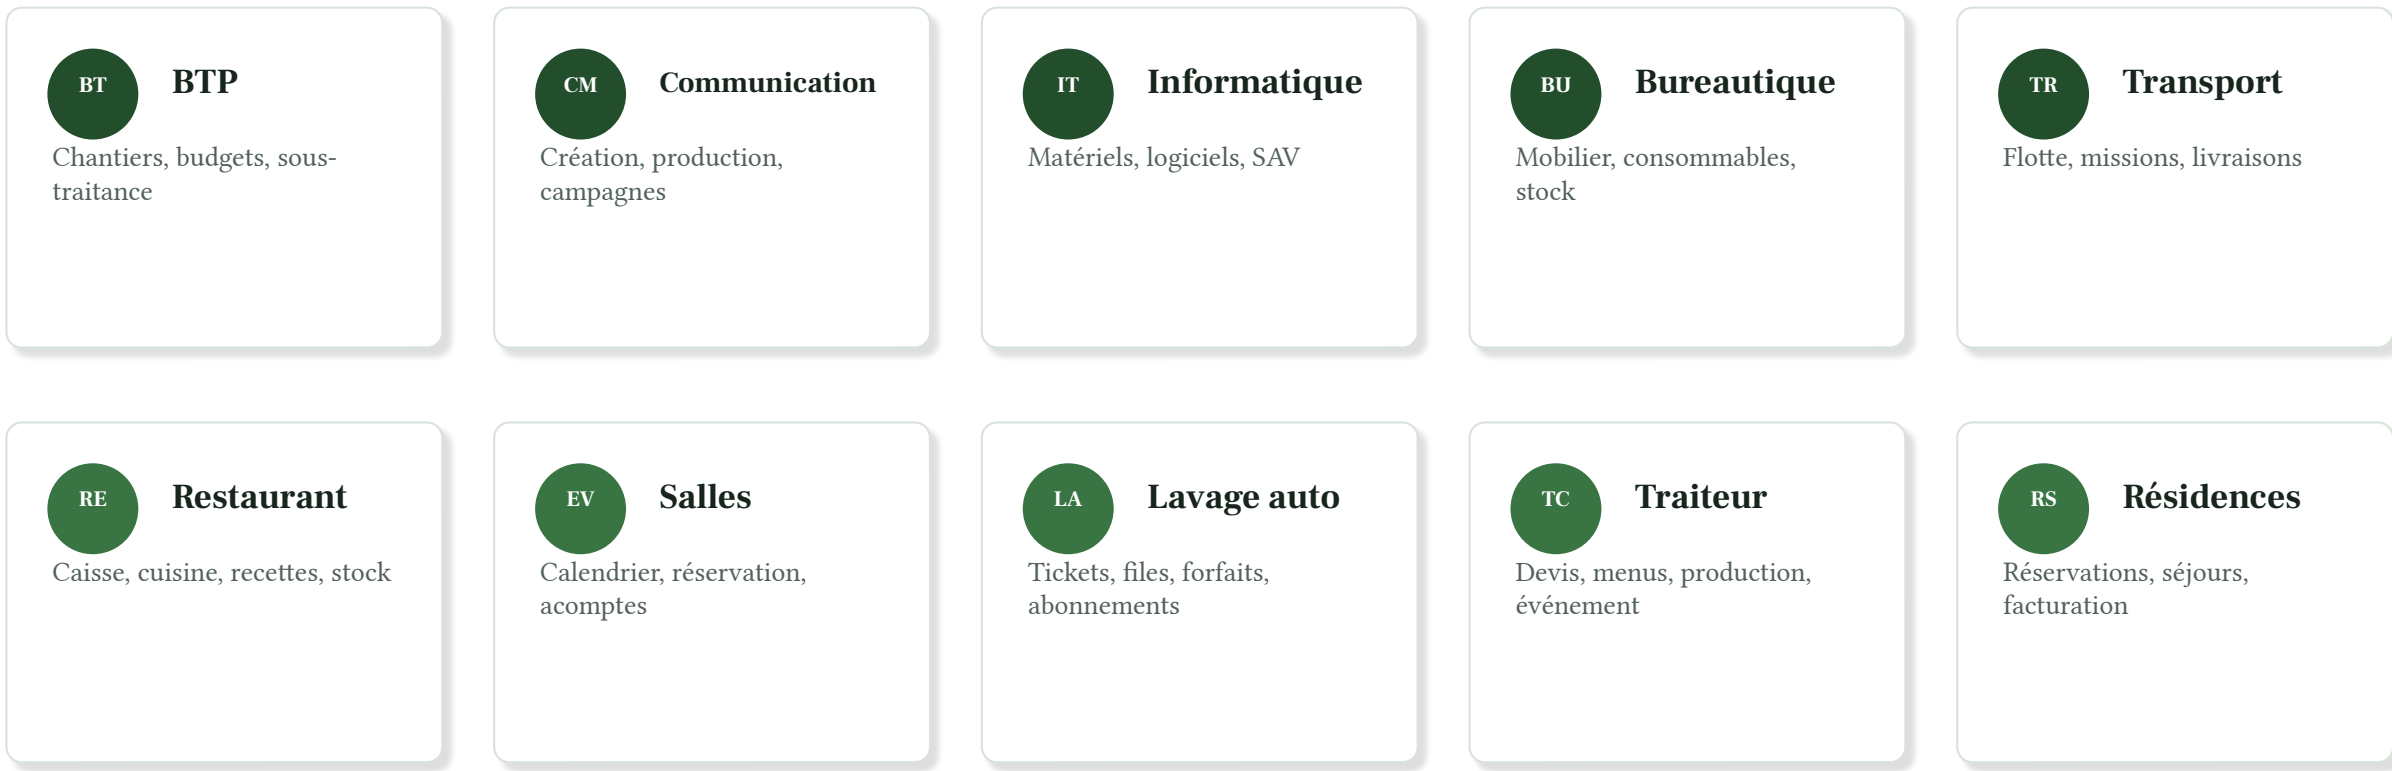

Un référentiel partagé : clients • fournisseurs • articles • collaborateurs • caisses • banques • centres de coûts • documents

Une donnée saisie une fois, exploitée partout

Chaque opération métier alimente automatiquement la trésorerie, la comptabilité et les indicateurs de gestion.



Socle transversal de l'ERP

Les fonctions utilisées par toutes les branches sont livrées une seule fois et paramétrées par activité.



CRM & ventes

Prospects, opportunités, devis, commandes, factures, relances.



Achats

Demandes, validations, bons de commande, réceptions, fournisseurs.



Stocks

Multi-dépôts, lots/séries, mouvements, inventaires, seuils d'alerte.



Finance

Caisses, banques, règlements, dépenses, créances, centres de coûts.



RH & temps

Personnel, présence, congés, feuilles de temps, éléments de paie.



Documents

Contrats, pièces jointes, numérotation, visa et piste d'audit.



Portail & mobile

Accès web, PWA mobile, profils, notifications et validations.



Pilotage

Budgets, marges, objectifs, tableaux de bord et exports.

Principe de contrôle : rôles par activité + seuils d'autorisation + validation électronique + journal d'audit.

BTP : piloter chaque chantier jusqu’à la marge finale

Un suivi opérationnel et financier de bout en bout pour les constructions, rénovations, démolitions, voiries et canalisations.



FC

Contrôle des coûts

Budgets par lot, demandes d’achat, contrats de sous-traitance, attachements, consommations et écarts.

OP

Pilotage du chantier

Planning, équipes, feuilles de temps, engins, photos, incidents, qualité, sécurité et réserves.


MG

Facturation & marge

Situations de travaux, retenues, acomptes, factures, encaissements et rentabilité consolidée.

Commerce, informatique, communication & bureautique

Un cycle devis–commande–livraison–facture complété par la gestion des équipements et du service après-vente.



Vente de matériels

- Catalogues et tarifs
- Numéros de série et garanties
- Livraisons partielles
- Marge par article et client



Services informatiques

- Contrats et abonnements
- Tickets d'assistance
- Temps passé et SLA
- Renouvellements et SAV



Communication

- Brief et bon à tirer
- Plan de charge créatif
- Sous-traitance / impression
- Coût et marge par campagne



Bureautique

- Stock multi-dépôts
- Kits et nomenclatures
- Inventaires et seuils
- Vente, location ou installation

Résultat attendu : connaître la marge réelle de chaque vente, contrat, campagne ou intervention.

Transport, logistique, résidences & traiteur

Des opérations planifiées et facturées depuis la même base clients, fournisseurs et trésorerie.

TRANSPORT & LOGISTIQUE

Ordre de mission

Affectation

Livraison

- Véhicules, chauffeurs, documents et disponibilité
- Carburant, péages, avances et dépenses de mission
- Maintenance préventive, pannes et immobilisations
- Preuve de livraison, facturation et rentabilité par trajet

Coût/km

indicateur flotte

Taux d'usage

indicateur disponibilité



Résidences

Disponibilités, réservation, check-in/check-out, dépôt de garantie, prestations annexes, facturation et état des chambres.




Traiteur

Devis par nombre de couverts, menus, fiches techniques, besoins matières, planning de production, équipes, livraison et marge par événement.

Restaurant : de la commande à la marge par plat

Une caisse rapide reliée à la cuisine, au stock, aux recettes et à la comptabilité.

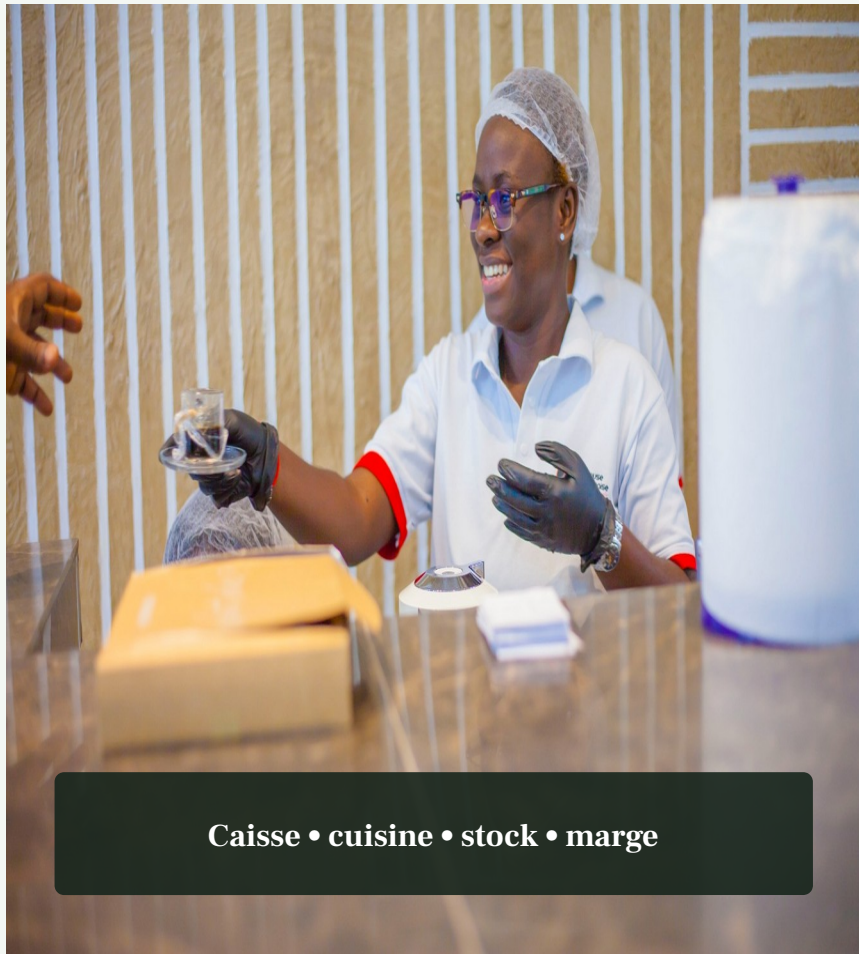

PV Point de vente

Tables, comptoir, emporter, livraison, remises, annulations et clôture de caisse.

CU Cuisine

Tickets cuisine, priorités, statuts, temps de préparation et ruptures.

ST Recettes & stock

Fiches techniques, portions, consommations automatiques, pertes et inventaires.

CL Clients & fidélité

Réservations, historique, comptes entreprise, points et abonnements.

KPI : chiffre d'affaires/jour • ticket moyen • coût matière • pertes • marge par plat • écart de caisse

Location de salles : sécuriser le calendrier et les acomptes

Une vue unique des disponibilités, des options, des contrats, des prestations et des soldes à encaisser.

JUILLET 2026

LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM	DIM
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

CONFIRMÉ

OPTION

R

Réservation

Capacité, type d'événement, créneau, option et date d'expiration.

D

Devis & contrat

Salle, décoration, sonorisation, restauration, personnel et taxes.

A

Acompte & solde

Échéancier, reçus, relances, dépôt de garantie et remboursement.

E


Exécution

Checklist, plan de salle, équipements, incidents et état des lieux.

Anti-double réservation • CA prévisionnel

Lavage automobile : fluidifier le service et la caisse

Un ticket par véhicule, une file visible, des forfaits maîtrisés et une clôture de caisse traçable.

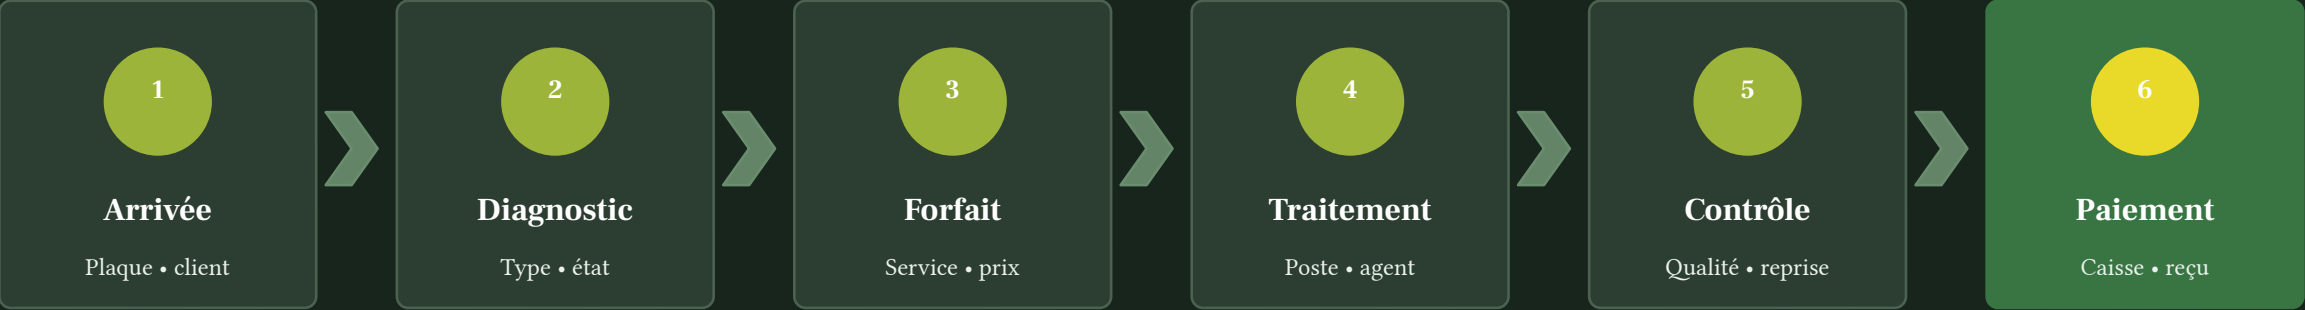

KPI : véhicules/jour • temps moyen • revenu/poste • consommables/véhicule • taux de reprise • écart de caisse

Architecture cible, sécurité et continuité de service

Une application web responsive, centralisée, sécurisée et conçue pour évoluer par modules.

UTILISATEURS

Direction • Finance • Ventes • Chantiers • Restaurant • Caisses • Mobile

APPLICATION ERP

Modules métiers • workflows • notifications • tableaux de bord • portail

SERVICES

API • génération PDF • e-mail/SMS • paiements • import/export • journal d'audit

DONNÉES & CLOUD

Base centralisée • chiffrement • sauvegardes • supervision • reprise



Accès

Profils, rôles, double authentification optionnelle, verrouillage et sessions.



Protection

HTTPS, chiffrement des secrets, séparation des environnements et mises à jour.



Sauvegardes

Quotidiennes, rétention définie, restauration testée et copie externalisée.




Traçabilité

Journal des connexions, validations, modifications sensibles et exports.

Disponibilité cible à confirmer au cadrage • reprise selon l'offre cloud • conservation des données à valider par le client

Des indicateurs communs et des tableaux de bord métier


La direction dispose d’une vue consolidée, puis peut descendre jusqu’à la transaction source.

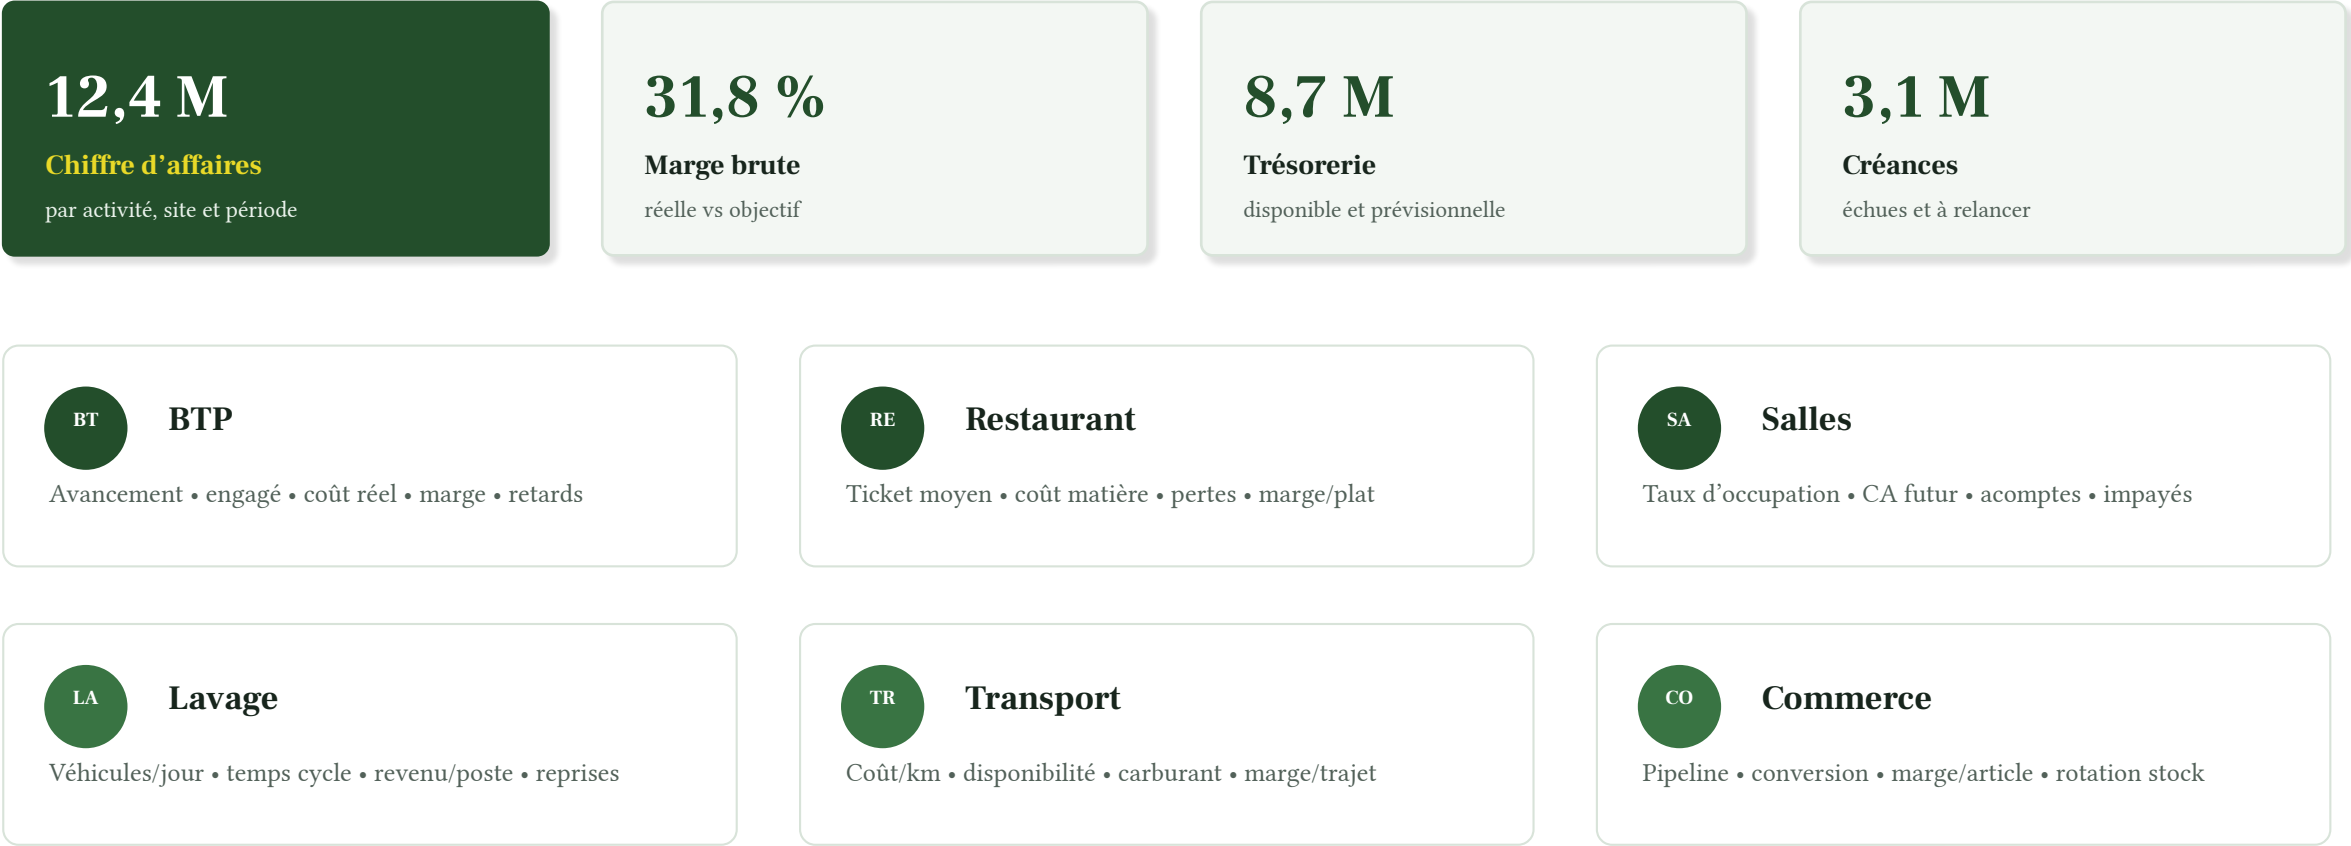

Les chiffres ci-dessus sont uniquement des illustrations de tableau de bord.

Planning de réalisation — 24 semaines

Livraison incrémentale, démonstration toutes les deux semaines et validation par jalons.

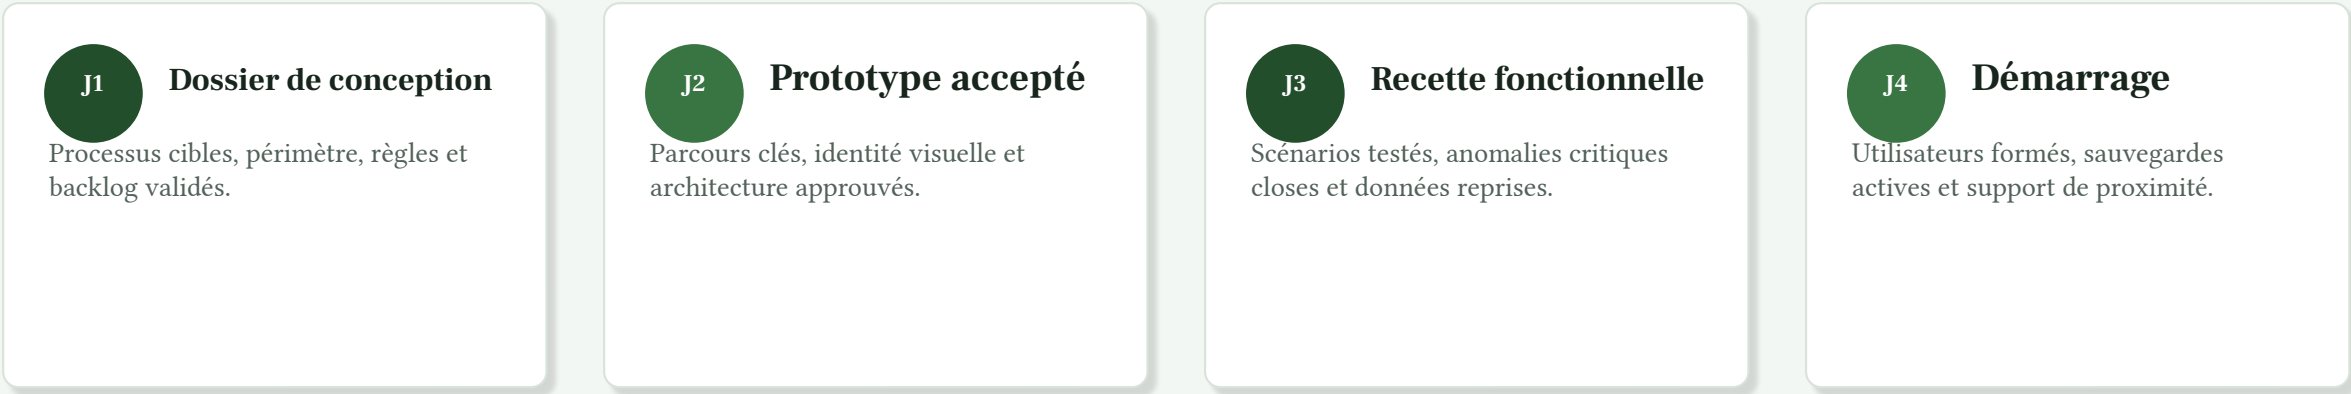

Après le lancement : 4 semaines d’hypercare incluses pour stabilisation et accompagnement.

Gouvernance, formation et transfert de compétences

Une organisation légère pour décider vite, sécuriser les données et favoriser l’adoption.

COP

Comité de pilotage

Direction générale, sponsor, chef de projet client et chef de projet intégrateur. Arbitrage mensuel : périmètre, budget, risques et décisions.

PRJ

Équipe projet

Référents par activité, finance, informatique et contrôle interne. Ateliers, préparation des données, tests et validation des règles.

RIT

Cadence

Point projet hebdomadaire, démonstration bimensuelle, registre des décisions, suivi des actions et tableau des risques.

PLAN DE FORMATION

Administrateurs

2 jours

Paramétrage, profils, référentiels, sauvegardes, support N1

Super-utilisateurs

3 jours

Processus métiers, contrôles, recette, assistance aux équipes

Utilisateurs finaux

6 sessions

Rôle par rôle, exercices sur données de démonstration

Direction

½ journée

Tableaux de bord, alertes, analyse et exports

Livrables : guides utilisateurs • procédures d’exploitation • dossier d’architecture • plan de sauvegarde • cahier de recette

Budget forfaitaire indicatif

Montants en FCFA hors taxes. Le prix définitif sera confirmé après cadrage et validation du périmètre.

POSTE	MONTANT HT
Cadrage, cartographie des processus & blueprint	2 250 000
UX/UI, prototype & architecture technique	2 500 000
Socle ERP : CRM, ventes, achats, stocks, finance, RH, documents	9 800 000
Module BTP & gestion de projets / chantiers	4 600 000
Module transport, logistique & flotte	3 200 000
Module restaurant : POS, cuisine, recettes & stock	3 300 000
Modules salles, traiteur & résidences	2 600 000
Module lavage automobile	1 900 000
Reporting, portail & expérience mobile PWA	2 100 000
Migration, paramétrage & intégrations standards	2 400 000
Recette, formation, déploiement & hypercare	2 200 000

TVA et retenues éventuelles selon la réglementation applicable. Services tiers et déplacements hors Abidjan non inclus.

TOTAL HT

36 850 000 FCFA

Échéancier de paiement et coûts récurrents

Les paiements sont liés à des livrables vérifiables ; l’exploitation récurrente démarre à la mise en production.

ÉCHÉANCIER PROPOSÉ

20 %	Commande & lancement	7 370 000 FCFA
20 %	Blueprint & prototype validés	7 370 000 FCFA
25 %	Socle ERP & BTP en recette	9 212 500 FCFA
20 %	Modules métiers en recette	7 370 000 FCFA
10 %	Mise en production	3 685 000 FCFA
5 %	Réception après hypercare	1 842 500 FCFA

EXPLOITATION RÉCURRENTÉ — NON INCLUSE

CL

Cloud, sauvegardes & supervision
Environnements de production, sauvegardes quotidiennes, certificats, monitoring et alertes.
240 000 FCFA / mois

SP

Support correctif & mises à jour
Assistance, correction d’anomalies, petites mises à jour, rapport mensuel et support aux administrateurs.
350 000 FCFA / mois

TOTAL RÉCURRENT INDICATIF**590 000 / mois**

SMS, WhatsApp, paiement en ligne, matériel de caisse et prestations évolutives : facturés selon consommation ou devis.

Conditions, hypothèses et prochaines étapes

Une validation rapide du périmètre permet de sécuriser le budget et la date de démarrage.



Inclus dans l'offre

- Conception, développement et paramétrage
- Environnements projet et production initiale
- Migration des référentiels et soldes d'ouverture
- Recette, formation et guides
- Mise en production et 4 semaines d'hypercare



Hypothèses structurantes

- Jusqu'à 50 utilisateurs nommés et 5 sites
- Données sources disponibles en Excel/CSV nettoyés
- Un référent client disponible par activité
- Interfaces tierces limitées aux API documentées
- Plan comptable et règles de gestion fournis par le client



À confirmer au cadrage

- Nombre exact de sites, caisses et dépôts
- Périmètre comptable et paie
- Historique à migrer et qualité des données
- Matériel POS, imprimantes et lecteurs
- Intégrations bancaires, mobile money, SMS ou WhatsApp

PROCHAINES ÉTAPES

1. Valider → 2. Cadrer → 3. Contractualiser → 4. Lancer

olivedanaroy@gmail.com
(+225) 07 77 99 99 48
